BRAVAPOOL

LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

PRESUPUESTO

127

PROPUESTA DE REFORMA

Rehabilitación integral de piscina

Desmontaje, impermeabilización y nueva cerámica, con control de calidad en cada fase.

PREPARADO PARA

Propietario/a

C/ Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona)

FECHA

21/10/2026

VÁLIDO HASTA

20/11/2026

PRESUPUESTO 127

Gracias por confiar en nosotros

Estimado/a cliente:

Le presentamos nuestra propuesta para la rehabilitación integral de su piscina desbordante en C/ Anoia, 14 · 17251 Calonge (Girona). Este documento recoge, por escrito y con claridad, la obra: los trabajos, los materiales, los plazos, la forma de pago y las garantías.

La piscina pierde agua. Para resolverlo desde el origen retiraremos toda la cerámica, la coronación y la impermeabilización antiguas, saneamos el soporte e impermeabilizamos el vaso y el canal desbordante con el sistema DryPool de Grupo Puma, un mortero bicomponente semiflexible pensado para soportar la presión del agua. Después colocamos cerámica nueva Rosa Gres de 30 × 60 cm, piezas de peldaño antideslizantes en los bancos y la escalera, y una coronación nueva con el labio del desbordante perfectamente nivelado.

Cada fase se revisa antes de empezar la siguiente y le entregamos la obra terminada.

Quedamos a su disposición para resolver cualquier duda o ajustar la propuesta a lo que necesite.

Bilal
Brava Pool

SU PISCINA EN CIFRAS

Dimensiones interiores	**7,50 × 4,00 m**
Superficie de lámina	**30 m²**
Profundidad	**1,70 m constante**
Volumen máximo aprox.	**51 m³**
Tipo	**Desbordante con canal en L**
Canal desbordante	**12,5 ml · paredes de 80 cm**
Bancos y escalera	**2 bancos (7,50 y 4,00 m) · 6 peldaños**
Revestimiento	**Rosa Gres 30 × 60 cm · ≈ 105 m²**
Impermeabilización	**Sistema DryPool · Grupo Puma**
Coronación	**Nueva · ≈ 37 ml**
Plazo estimado	**5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial**

NUESTRO COMPROMISO

Plazos por escrito
Planificación por fases desde el primer día y plazo de ejecución indicado en este documento.

Pagos por hitos
Cada pago se vincula a una fase terminada y el 20 % final queda retenido hasta la entrega.

Garantía por escrito
3 años en el revestimiento y 2 años en los trabajos y la mano de obra, además de las garantías legales.

Obra limpia
Retiramos todos los escombros a un punto limpio autorizado y entregamos la piscina y su entorno limpios.

Regalo promocional
Cloración salina Bright Blue de 20 g/h con pH automático Sanus NG, instalada sin coste.

Estado actual de la piscina

Fotografías de la piscina antes de la obra. Sirven de referencia para el replanteo y para comprobar, al terminar, que se respeta su geometría y su aspecto.



Vista general desde la terraza
Piscina desbordante en ladera, con vistas al valle, coronación de piezas de gran formato y rejilla lineal en el pavimento.



Canal de desbordamiento
Canal perimetral junto al lado del valle, con su muro exterior y coronación.



Escalera y banco interior
Escalera de acceso, banco, foco y boquilla de impulsión en pared.





Fondo y sumidero
Revestimiento cerámico rectangular y sumidero de fondo.

Fotografías del cliente tomadas antes de la intervención. Su estado real (fisuras, filtraciones, desprendimientos) se determina en la inspección técnica inicial.

Plano de la piscina

Distribución de la piscina de 7,50 × 4 m y situación de los elementos principales.

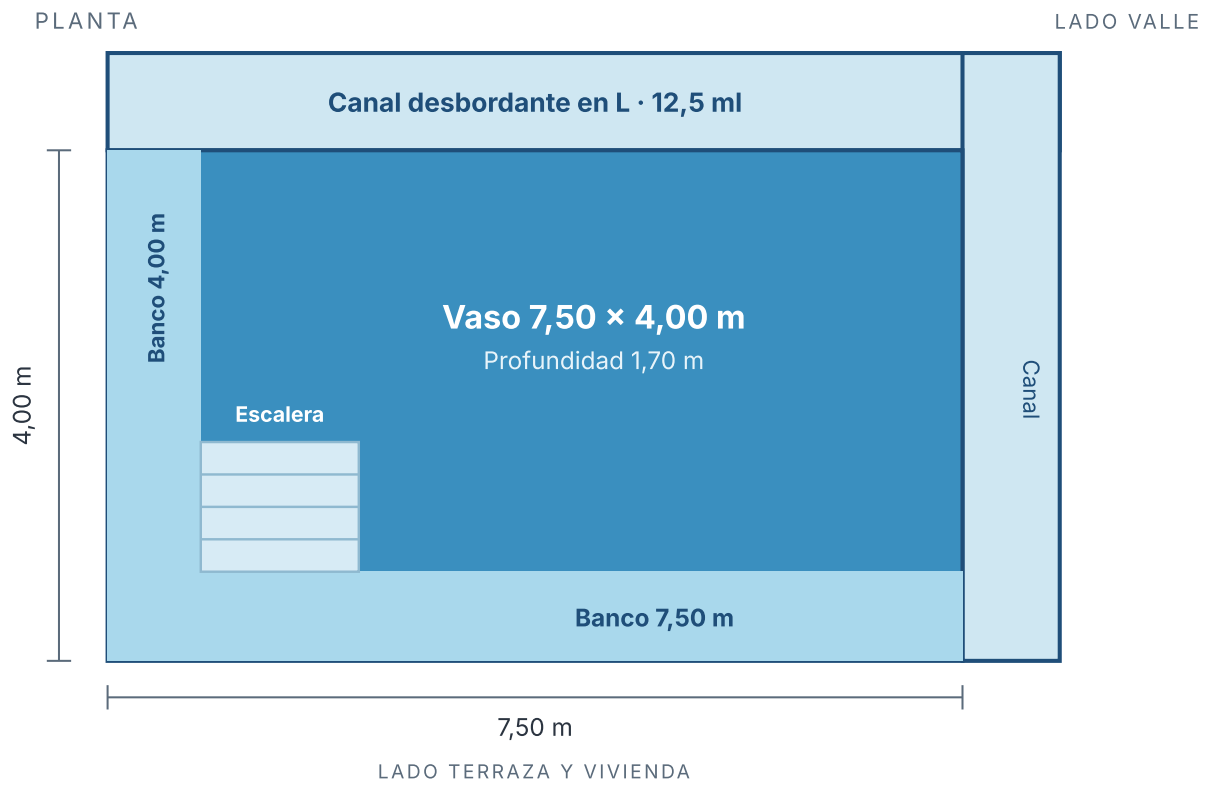




Vaso	7,50 × 4,00 m · 1,70 m de profundidad
Bancos	2 (7,50 m y 4,00 m)
Escalera	1 · 6 peldaños
Canal desbordante	En L · 12,5 ml · paredes de 80 cm

Plano orientativo, sin escala. Las medidas y la posición definitiva de cada elemento se confirman con el cliente en el replanteo.

Sistema constructivo y materiales

La estanqueidad de una piscina depende del conjunto de capas, no de un solo producto. Este es el sistema previsto y su orden de ejecución.

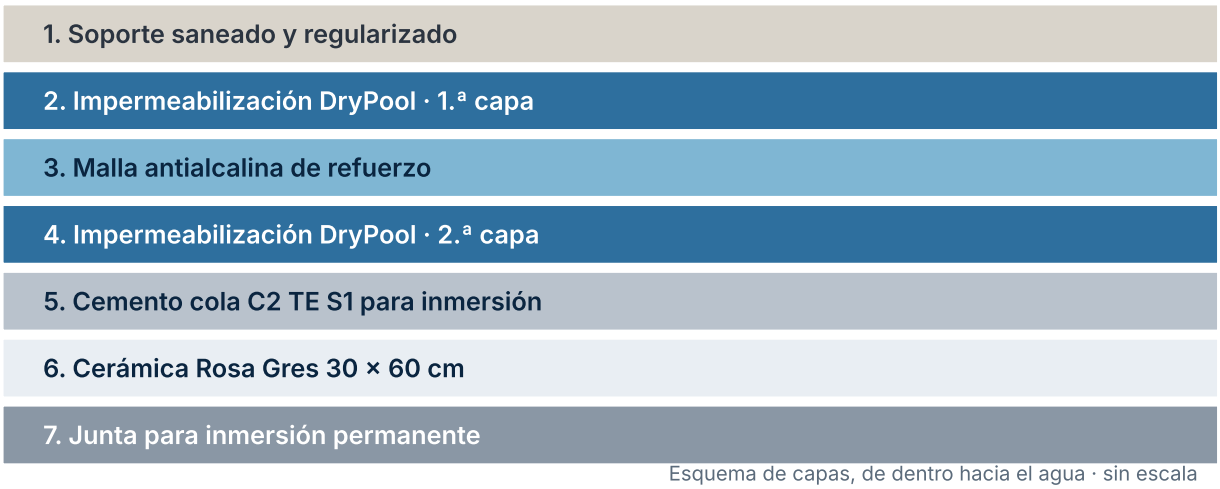

Esquema de capas, de dentro hacia el agua · sin escala


MATERIALES Y MARCAS

ELEMENTO	MARCA	DETALLE
Impermeabilización	**Grupo Puma**	Sistema DryPool · mortero bicomponente semiflexible y malla antialcalina
Revestimiento	**Rosa Gres**	Porcelánico 30 × 60 cm apto para inmersión (modelo y color a confirmar)
Bancos y escalera	**Rosa Gres**	Pieza de peldaño antideslizante (referencia a confirmar)
Cemento cola	**Por definir**	Adhesivo cementoso C2 TE S1, apto para inmersión permanente
Rejuntado	**Por definir**	Mortero de juntas para inmersión permanente (tipo y color a confirmar)
Coronación	**Por definir**	Modelo y acabado a confirmar por escrito
Cloración salina (regalo)	**Bright Blue**	Serie Pluma de 20 g/h (modelo a confirmar) con regulador de pH automático Sanus NG

Los productos se aplican según las fichas técnicas vigentes de cada fabricante. Cualquier cambio de referencia se comunica al cliente por escrito antes del pedido.

Planificación de la obra

Plazo total estimado: 5 a 6 semanas desde el inicio de obra, a confirmar tras la inspección inicial. Cada fase se verifica antes de empezar la siguiente.

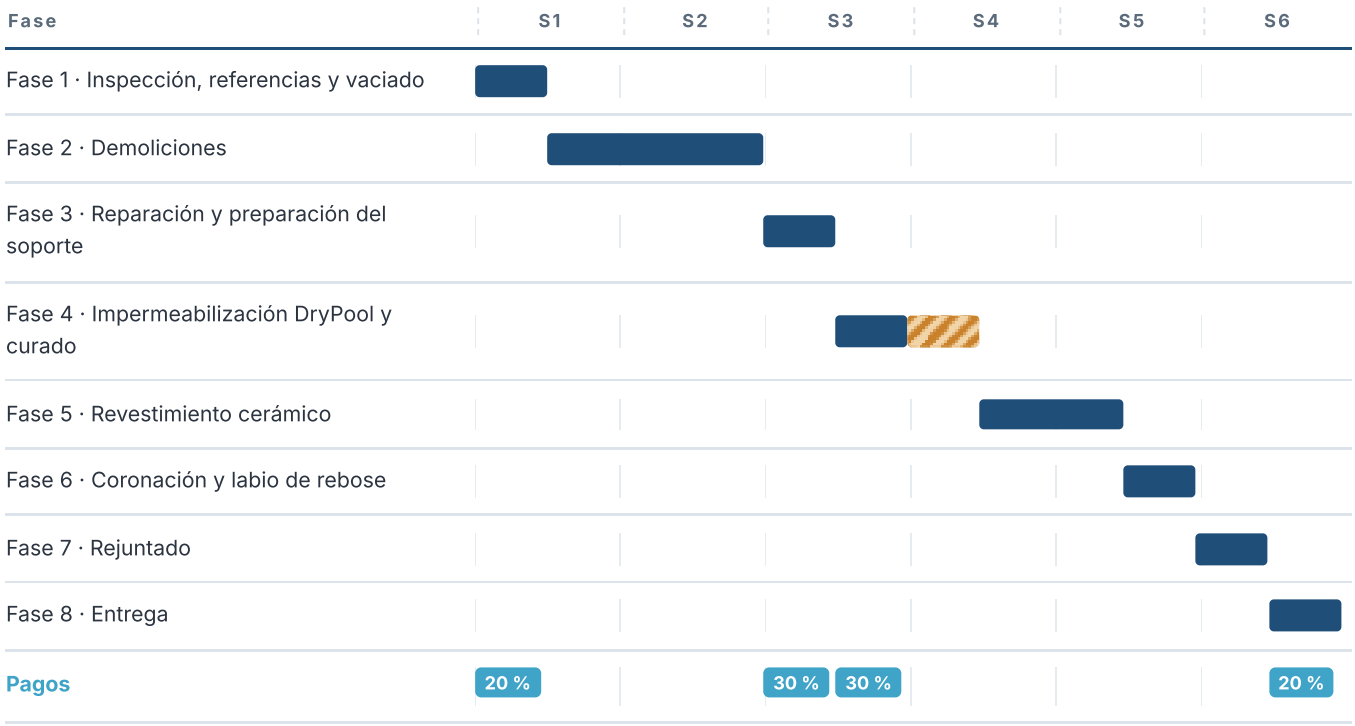

Tiempo de curado del mortero según ficha técnica del fabricante. Planificación orientativa: puede variar según el tipo de terreno, la meteorología y la entrega de materiales; cualquier cambio se comunicará con antelación.

FORMA DE PAGO

PAGO	HITO	IMPORTE CON IVA
20 %	A la aceptación del presupuesto (reserva de obra y pedido de materiales)	5.463,88 €
30 %	Al terminar la Fase 3, antes de impermeabilizar	8.195,81 €
30 %	Al terminar la Fase 4, antes de colocar la cerámica	8.195,81 €
20 %	Retención final: a la entrega de la obra terminada	5.463,88 €

Forma de pago: transferencia bancaria a nombre de Brava Pool.

Descripción de los trabajos

Nº	Descripción	Cant.	Ud.
01	**FASE 1 · INSPECCIÓN, REFERENCIAS Y VACIADO**		
1.1	**Inspección inicial y estado previo** • Revisión del vaso, del canal desbordante en L, de la escalera, de los bancos y de los pasamuros. • Reportaje fotográfico del estado previo, que se entrega al cliente.	1	PA
1.2	**Toma de referencia de la línea de flotación** • Con la piscina aún llena y desbordando, se marca el nivel real del agua en todo el perímetro. • Se mide la diferencia de altura entre el labio de rebose y la coronación del resto de la piscina. • Estas referencias se usan después para replantear la nueva coronación.	1	PA
1.3	**Vaciado y protección de la zona de obra** • Vaciado de la piscina y del canal desbordante. • Protección de la terraza, el jardín y las zonas de paso durante toda la obra. • Retirada y reposición de mobiliario, macetas y otros elementos situados junto al vaso.	1	PA
02	**FASE 2 · DEMOLICIONES**		
2.1	**Desmontaje de la coronación** • Retirada de la coronación del borde de la piscina, del labio de rebose y del muro exterior del canal. • Si es imprescindible para extraer la coronación, levantado y reposición de las piezas de pavimento colindantes y de la rejilla lineal de la terraza (condicionado a la inspección; se valora aparte).	37	ml
2.2	**Desmontaje de la cerámica** • Retirada de toda la cerámica del vaso, los bancos, la escalera y el canal desbordante. • Retirada de los restos de cemento cola hasta dejar el soporte limpio.	105	m²
2.3	**Eliminación de la impermeabilización antigua** • Picado y retirada de la impermeabilización deteriorada hasta llegar a una base sana.	105	m²
2.4	**Retirada de escombros** • Carga, transporte y depósito de todos los escombros en un punto limpio autorizado.	1	PA

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.
03	**FASE 3 · REPARACIÓN Y PREPARACIÓN DEL SOPORTE**		
3.1	**Saneado y lijado del vaso y del canal** • Limpieza a fondo y eliminación de partes sueltas. • Lijado del soporte y reparación de fisuras. • Regularización de paredes, fondo, bancos y peldaños.	1	PA
3.2	**Revisión de pasamuros y puntos singulares** • Revisión y sellado de los focos, las boquillas de impulsión, el sumidero de fondo y los desagües del canal, que son los puntos donde suelen producirse las fugas. • Número y posición de cada elemento: se confirman en la inspección inicial.	1	PA
3.3	**Pendiente del fondo del canal** • Corrección de la pendiente del fondo del canal hacia el sumidero para que el agua no quede estancada.	12,5	ml
3.4	**Replanteo de la línea de flotación y del muro de rebose** • Replanteo con nivel láser de la cota del labio de rebose a partir de las referencias de la Fase 1. • Regularización del muro de rebose para que quede nivelado en los dos tramos del canal (7,50 m y 4,00 m), con una tolerancia máxima de ±2 mm.	1	PA
04	**FASE 4 · IMPERMEABILIZACIÓN · SISTEMA DRYPOOL DE GRUPO PUMA**		
4.1	**Suministro y aplicación del sistema de impermeabilización DryPool** • Suministro del mortero impermeabilizante bicomponente semiflexible DryPool de Grupo Puma y de la malla antialcalina de refuerzo, según ficha técnica del sistema. • Humectación del soporte y refuerzo de esquinas, juntas y puntos singulares. • Aplicación en dos capas con malla entre ellas, en el vaso, los bancos, la escalera y el canal. • Curado según las indicaciones del fabricante antes de pasar a la fase siguiente.	105	m²

Descripción de los trabajos (cont.)

Nº	Descripción	Cant.	Ud.
05	**FASE 5 · REVESTIMIENTO CERÁMICO ROSA GRES**		
5.1	**Suministro y colocación de cerámica Rosa Gres 30 × 60 cm y cemento cola para piscinas** • Porcelánico apto para inmersión permanente, con reserva por cortes y roturas (112 m² suministrados). • Cemento cola C2 TE S1 apto para inmersión permanente, con doble encolado. • Replanteo de piezas y colocación en vaso y canal, con cortes y remates en focos, boquillas, sumidero y esquinas.	105	m²
5.2	**Suministro y colocación de piezas de peldaño Rosa Gres** • Pieza antideslizante a juego con el revestimiento para el banco de 7,50 m, el banco de 4,00 m y la escalera de 6 peldaños. • Colocación con cortes y remates.	35	ud
06	**FASE 6 · CORONACIÓN Y LABIO DE REBOSE**		
6.1	**Suministro y colocación nivelada de coronación y piezas de rebose** • Coronación para el borde de la piscina y el muro exterior del canal, y pieza especial de labio de rebose para los tramos de 7,50 m y 4,00 m. • Modelo y acabado a confirmar por escrito, a juego con la cerámica Rosa Gres. • Colocación de las piezas de los extremos a la cota del láser y del resto al hilo, con nivelación pieza a pieza y tolerancia máxima de ±2 mm.	37	ml
6.2	**Prueba de lámina de agua** • Antes de rejuntar, llenado hasta que la piscina desborda. • Comprobación de que el agua cae de forma uniforme en toda la longitud del rebose. • Corrección de cualquier punto que no desborde igual.	1	PA
07	**FASE 7 · REJUNTADO**		
7.1	**Suministro y aplicación de rejuntado de cerámica, peldaños y coronación** • Mortero de juntas apto para inmersión permanente (tipo y color a confirmar por escrito). • Limpieza de restos de junta.	105	m²
08	**FASE 8 · ENTREGA**		
8.1	**Revisión final y entrega de la obra** • Revisión de acabados con el cliente y acta de entrega. • Limpieza final de obra y retirada de protecciones.	1	PA
+	**PROMOCIÓN**		
R.1	**Regalo promocional: cloración salina y pH automático** • Equipo de cloración salina Bright Blue de la serie Pluma, de 20 g/h de producción de cloro (modelo exacto a confirmar), con la célula de electrólisis instalada en bypass. • Regulador de pH automático Sanus NG, con sonda, bomba peristáltica, punto de inyección y depósito. • Suministro e instalación incluidos, sin ningún coste adicional. Puesta en marcha con la piscina llena, una vez realizado el llenado, y explicación del funcionamiento de los equipos. • La instalación se realiza sobre la depuración existente, previa comprobación en la inspección inicial.	1	ud

PA = partida alzada. Las mediciones son estimadas y se ajustan con las medidas tomadas en obra. El precio es cerrado e incluye materiales y mano de obra de todas las partidas.

Resumen de la inversión

Precio cerrado con todos los materiales, la mano de obra, el transporte y la retirada de escombros incluidos.

CAP.	CONCEPTO	ESTADO
01	Fase 1 · Inspección, referencias y vaciado	Incluida
02	Fase 2 · Demoliciones	Incluida
03	Fase 3 · Reparación y preparación del soporte	Incluida
04	Fase 4 · Impermeabilización · sistema DryPool de Grupo Puma	Incluida
05	Fase 5 · Revestimiento cerámico Rosa Gres	Incluida
06	Fase 6 · Coronación y labio de rebose	Incluida
07	Fase 7 · Rejuntado	Incluida
08	Fase 8 · Entrega	Incluida
+	Regalo promocional: cloración salina y pH automático	Regalo
Base imponible		**22.578,00 €**
IVA 21 %		4.741,38 €
Total presupuesto (IVA incl.)		**27.319,38 €**

Promoción. Con este presupuesto, Brava Pool regala un equipo de cloración salina Bright Blue de 20 g/h con regulador de pH automático Sanus NG, instalado y sin ningún coste adicional.

El tipo de IVA aplicable depende de las condiciones de la vivienda y de la obra; se confirma al cerrar el presupuesto.

Garantías y compromisos

CLÁUSULA 1

Garantía en todos nuestros trabajos

Al tratarse de una reforma, Brava Pool garantiza el nuevo revestimiento durante 3 años y todos los trabajos realizados y la mano de obra durante 2 años. Estas garantías comerciales se suman a las garantías legales que correspondan según la normativa vigente.

El servicio técnico y las reparaciones en garantía se atienden durante todo el año, sin limitación de temporada. Ante cualquier incidencia comunicada por teléfono, WhatsApp o correo electrónico, respondemos por escrito en un plazo máximo de 48 horas.

CLÁUSULA 2

Control de calidad en cada fase

Revisamos y fotografiamos el soporte tras la demolición, la continuidad de la impermeabilización y los puntos singulares, la colocación y el rejuntado de la cerámica. Antes de la entrega hacemos una revisión final de acabados con el cliente.

CLÁUSULA 3

Compromiso de obra limpia

El precio incluye la retirada de todos los escombros de la obra, su transporte y su depósito en un punto limpio autorizado.

Durante la obra protegemos las zonas de paso y el jardín, y al terminar retiramos todos los restos de material para entregar la piscina y su entorno limpios.

CLÁUSULA 4

Pagos por hitos y retención final

Los pagos se vinculan al avance de la obra: el primero reserva la obra y el pedido de materiales y los siguientes se abonan al terminar cada hito indicado. El último 20 % queda retenido hasta la entrega de la obra terminada.

Condiciones y aceptación

BRAVAPOOL
LA TEVA PISCINA SEMPRE A PUNT

NO INCLUYE

- Reparación de daños estructurales, tuberías o pasamuros ocultos que aparezcan al desmontar (se presupuestarán aparte).
- Equipos de filtración y depuración, salvo el equipo de sal de la promoción.
- Pavimento exterior de la terraza, salvo las piezas colindantes que sea imprescindible levantar y reponer (se valoran tras la inspección).
- Prueba de estanqueidad y llenado, agua para el llenado y productos químicos de puesta en marcha.
- Licencia o permiso de obra y tasas municipales, si fueran necesarios.

CONDICIONES

- Cualquier trabajo no descrito en este presupuesto se presupuestará aparte y por escrito antes de realizarlo.
- El modelo y el color de la cerámica, de la coronación y de las juntas se confirmarán por escrito antes de su pedido.
- Las mediciones son estimadas y se ajustarán con las medidas tomadas en obra.
- El cliente facilitará el acceso a la obra y el suministro de agua y luz durante los trabajos.
- Este presupuesto es válido hasta el 20/11/2026.

Aceptación del presupuesto

El cliente declara conocer y aceptar el presente presupuesto n.º 127, por un importe total de **27.319,38 €** IVA incluido, sus condiciones y la forma de pago indicada.

Nombre y apellidos

Firma del cliente

DNI / NIF

Por Brava Pool

Lugar y fecha

¿Alguna duda? Bilal · www.bravapool.com
